N°	Nom de la tâche	Durée
1	Réunion préparatoire	1 jr
2	Relevé TOPO	15 jrs
3	Avant Projet définitif	20 jrs
4	Cas par cas	40 jrs
5	Permis de construire	45 jrs
6	PRO	35 jrs
7	Appel d'offres	20 jrs
8	Analyse des offres	15 jrs
9	Commission d'appel d'offre	5 jrs
10	Notification / Ordre de service	5 jrs
11	Période de préparation	25 jrs
12		
13	Présence d'un herpétologue	95 jrs
14	**Travaux piste de luge 4 saisons et batiment d'exploitation**	**131 jrs?**
15	Plans d'exécution	25 jrs
16	Etude G3	1 jr?
17	**Piste**	**74 jrs**
18	Terrassements pour mise en place des rails (montée et descente)	15 jrs
19	Mise en place des rails	60 jrs
20	Réalisations des gares aval et amont	40 jrs
21	Stockage des luges dans le batiment	20 jrs
22	**Batiment**	**95 jrs**
23	Terrassements	5 jrs
24	Fondations	15 jrs
25	Dallages	15 jrs
26	Structure bois	20 jrs
27	Couverture	15 jrs
28	Murs structures bois et menuiseries	20 jrs
29	Equipement électricité CFO / Cfa	10 jrs
30	Ouvrages de serrurerie	15 jrs
31	Mise en service	10 jrs
32	Réception	0 jr

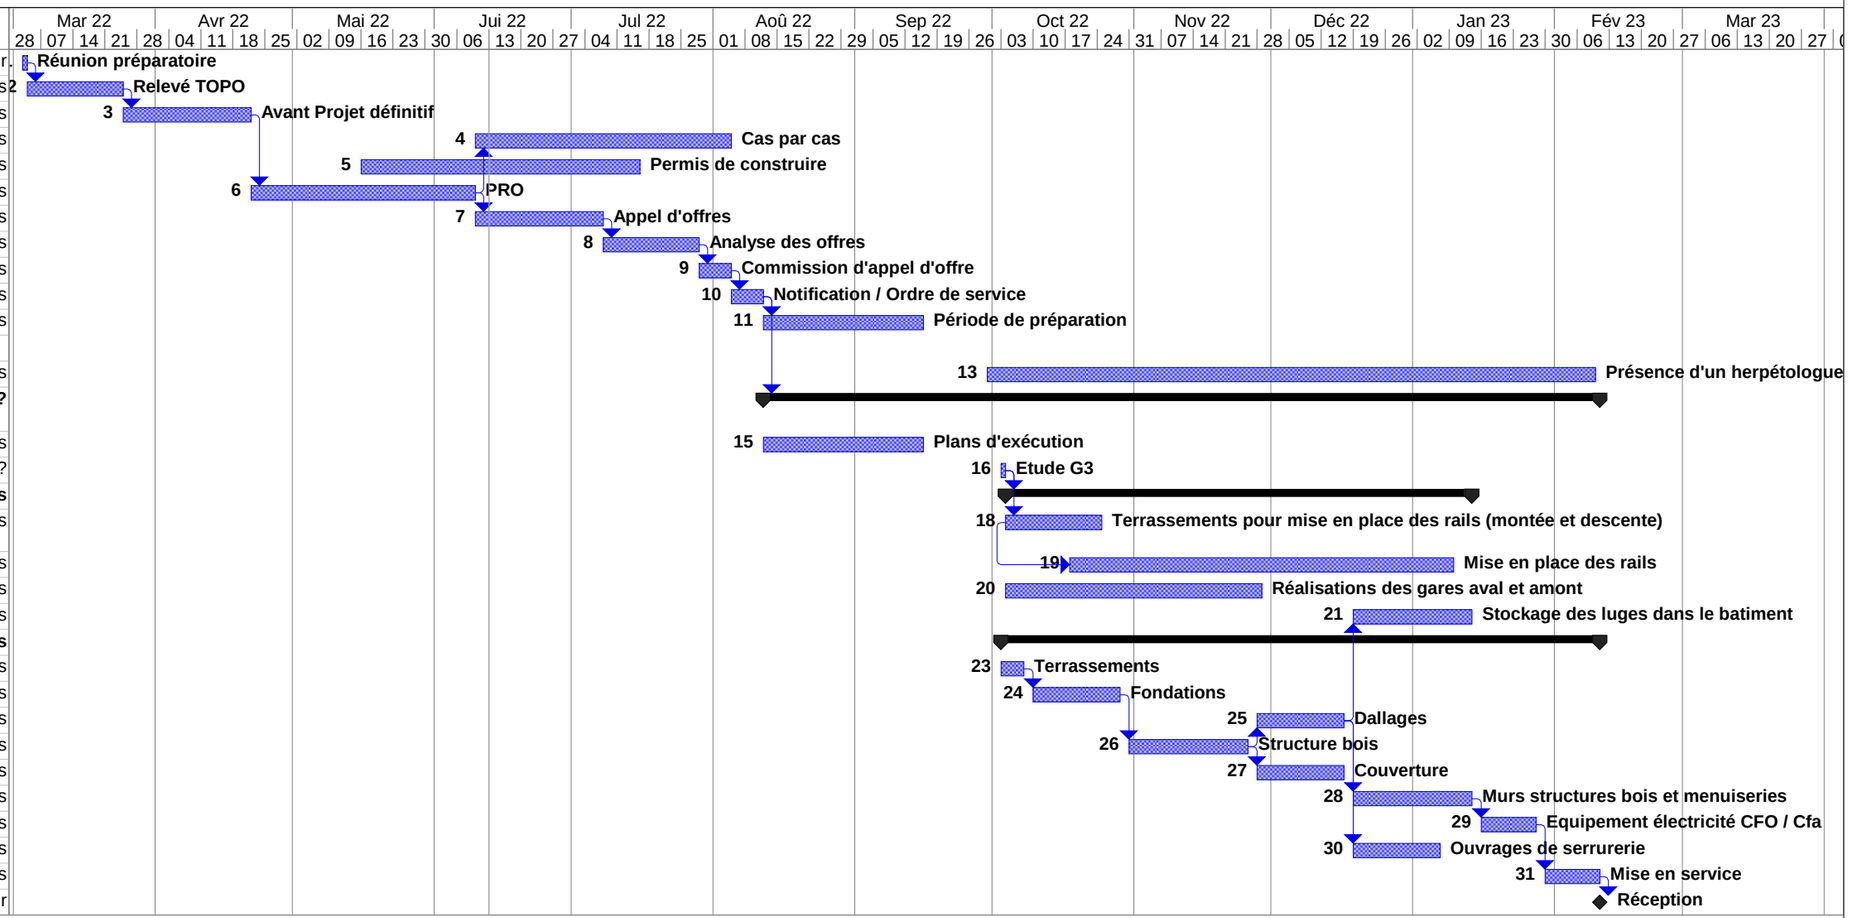

AD2i INGENIERIE
