MOE Amenagements des abords du CNEM - Commune de Saint-Tropez

Planning travaux général V01

Cas dossier de declaration Mar 20/07/21
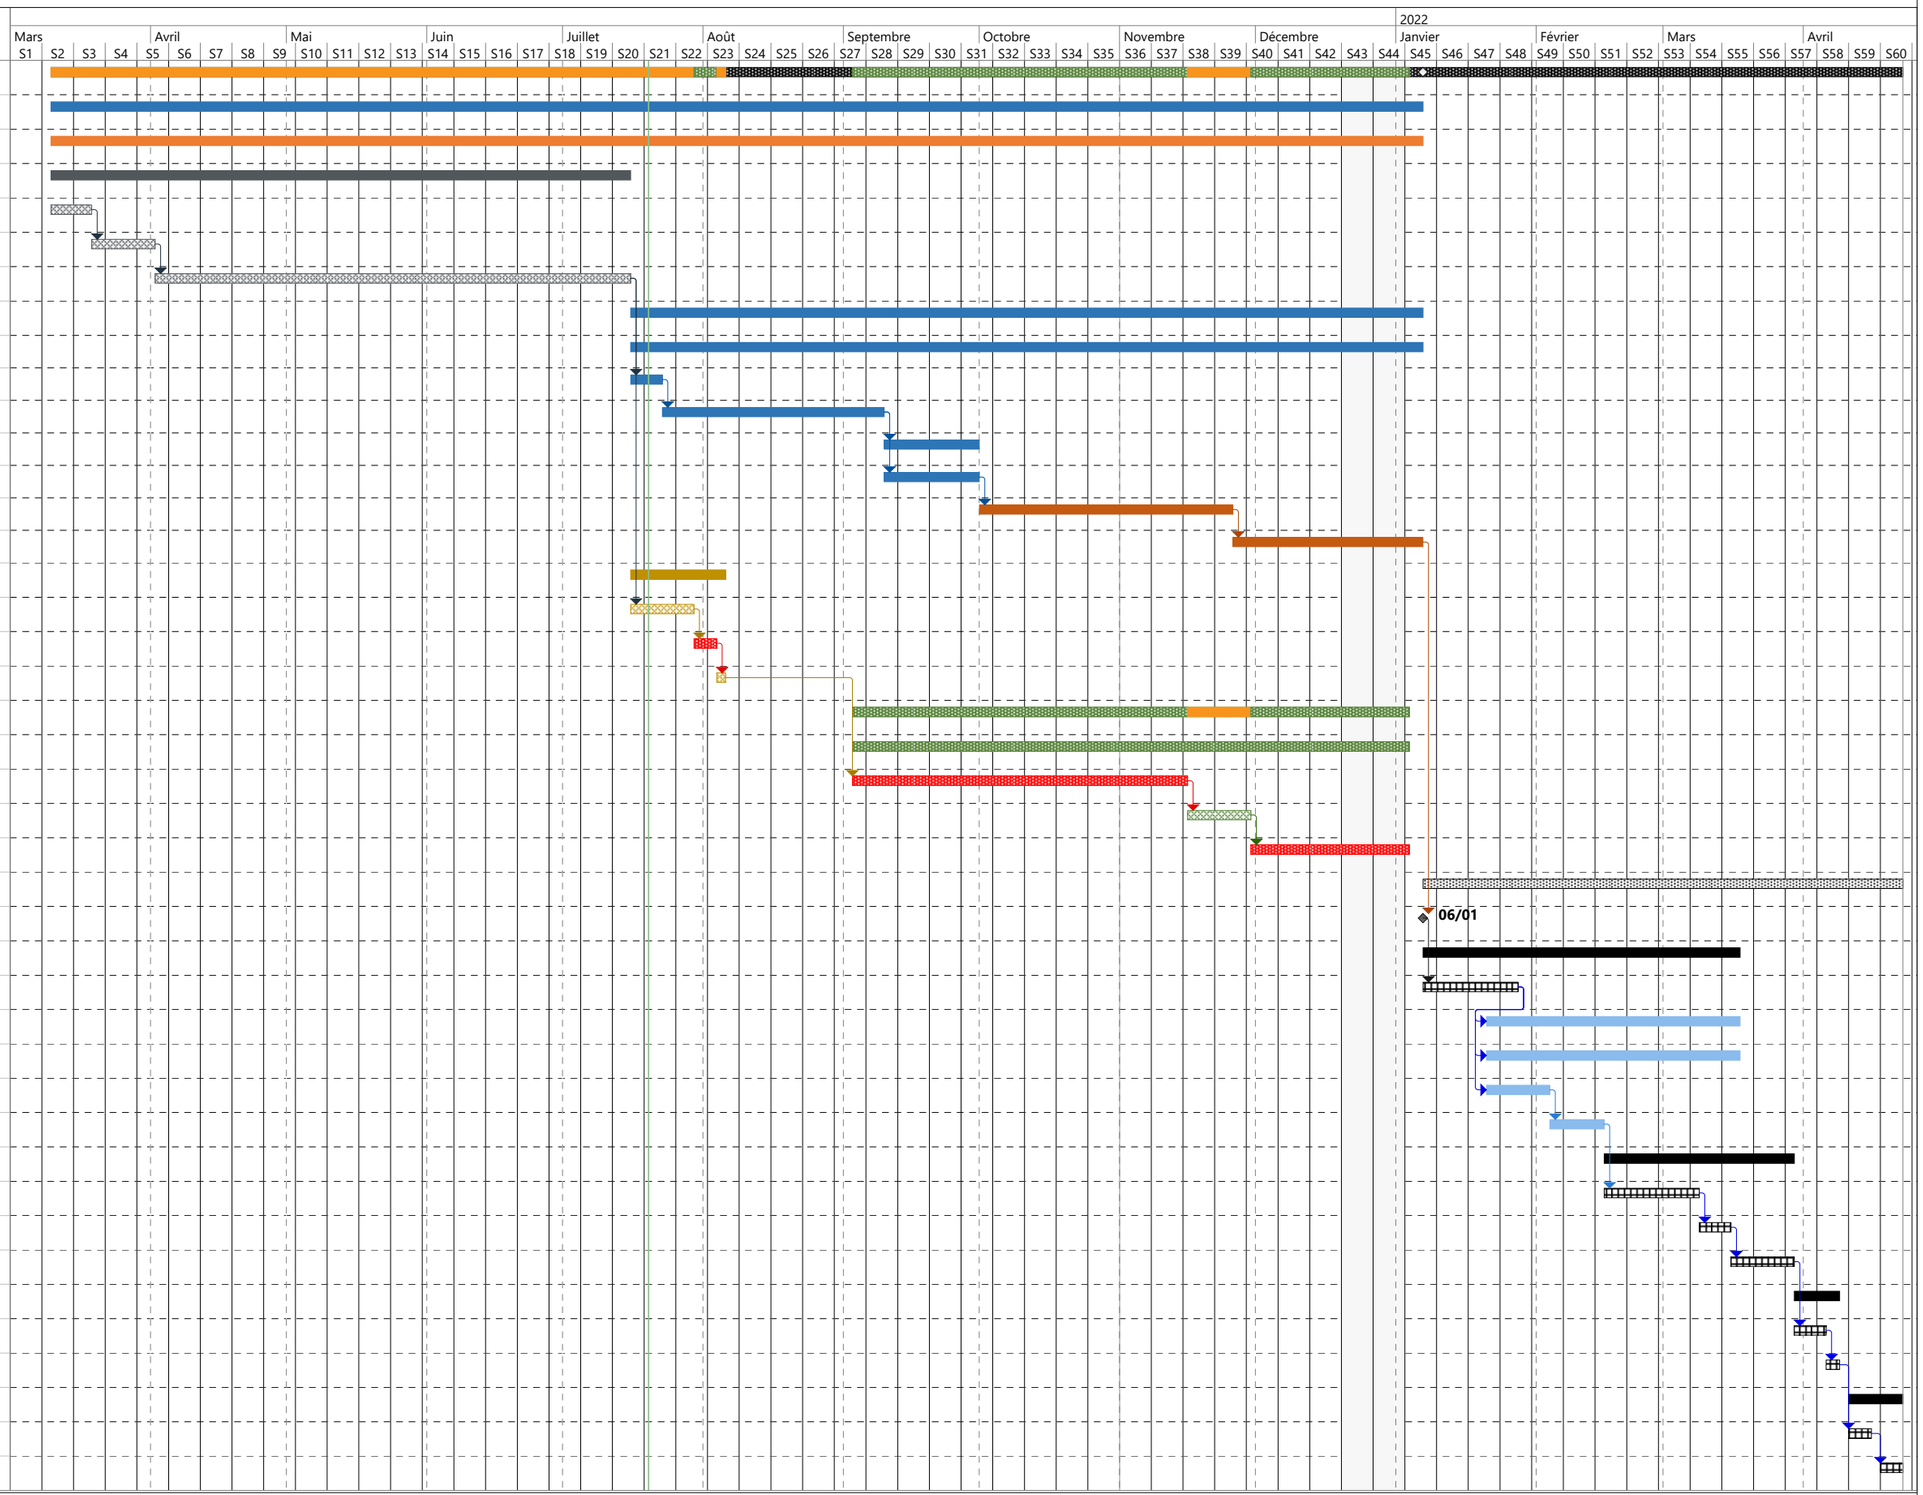
N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Planning Opération**	**283 jours**
2	**Maitrise d'oeuvre**	**207 jours**
3	**Missions de base**	**207 jours**
4	**Mission PRO**	**92 jours**
5	Rendu	7 jours
6	Validation bureau et contrôle et CSPC	10 jours
7	Mise à jour FTM1, 2 et 3	75 jours
8	**Mission REG**	**115 jours**
9	**Dossier autorisation**	**115 jours**
10	Dossier Cas par Cas	5 jours
11	Instruction Autorité environementale	35 jours
12	Dossier de decalaration (CG3P)	15 jours
13	Dossier AOT	15 jours
14	Instruction services de la DDTM	2 mois
15	Arrêté préfectoral	1 mois
16	**Mission DCE**	**15 jours**
17	DCE Travaux	10 jours
18	Validation DCE MOA/BC/CSPCS	3 jours
19	Maj DCE Travaux	2 jours
20	**Mission ACT**	**77 jours**
21	**Marchés Travaux**	**77 jours**
22	Consultation entreprises	52 jours
23	Analyse et mise au point marché	10 jours
24	Commission appel d'offre	15 jours
25	**Travaux**	**76 jours**
26	Notification Marché	0 jour
27	**Travaux preparatoires**	**50 jours**
28	Etudes d'exécution	15 jours
29	Prefabrication ponton	40 jours
30	Commande pieux	40 jours
31	Installation de chantier	10 jours
32	Piste d'accés chantier	8 jours
33	**Pieux**	**30 jours**
34	Vibrofonçage des pieux	15 jours
35	Recepage et betonnage	5 jours
36	Chevetre	10 jours
37	**Tablier**	**8 jours**
38	Montage	5 jours
39	Pose	3 jours
40	**Fin de chantier**	**10 jours**
41	Finition	5 jours
42	repliement	5 jours
