Ouvrage de lutte contre l'erosion et submersion
Plages de Canadel - Planning opération - Cas par cas - Indice 01
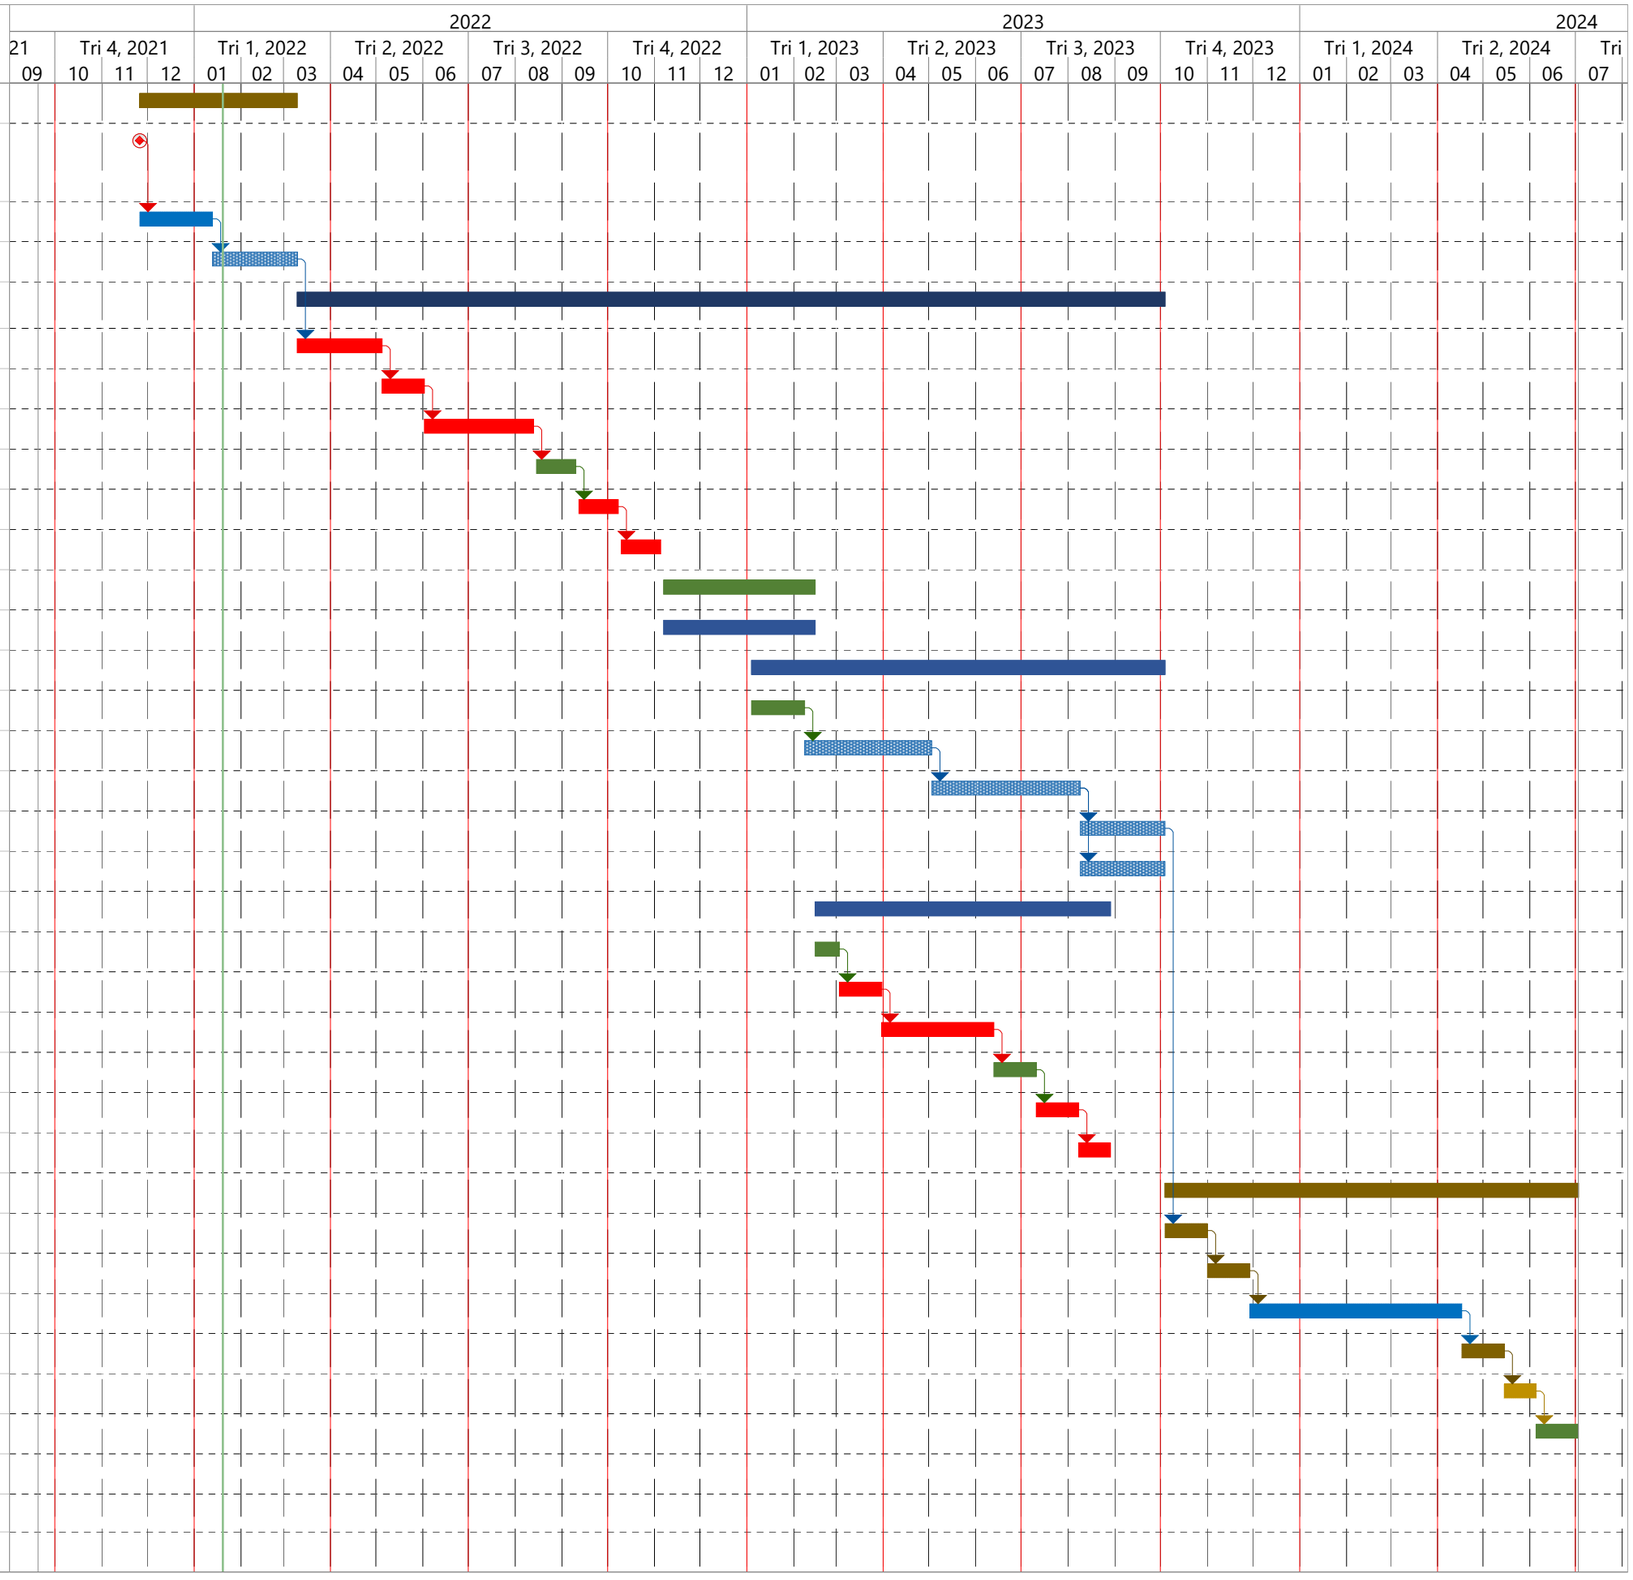
N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Assistance à Maitre d'ouvrage**	**66 jours**
2	**Délibération autorisant le Maire a déposer le dossier Cas par Cas**	**0 jour**
3	Dossier Cas par cas	26 jours
4	**Avis autorité environnementale**	**40 jours**
5	**MAITRISE D'ŒUVRE Phases PRO, DCE, ACT**	**409 jours**
6	**DCE de consultation**	**2 mois**
7	**Décision mise en ligne**	**1 mois**
8	**Délais de consultations**	**52 jours**
9	Analyse des offres	1 mois
10	**Commission AO**	**1 mois**
11	**Contrôle de légalité et délai de recours**	**1 mois**
12	**MISSION TÉMOIN**	**72 jours**
13	**Mission PRO**	**72 jours**
23	**Mission IPD**	**195 jours**
24	Dossier LEMA, concession, paysage, Natura 2000	25 jours
25	**Avis autorité de l'Etat**	**60 jours**
26	**Nomination enquêteur et Enquête publique**	**70 jours**
27	**Arrêté préfectoral autorisant les travaux**	**40 jours**
28	**Contrat de concession**	**40 jours**
29	**Mission ACT**	**139 jours**
30	DCE	12 jours
31	**Décision mise en ligne**	**20 jours**
32	**Délais de consultations**	**52 jours**
33	Analyse des offres	20 jours
34	**Commission AO**	**20 jours**
35	**Contrôle de légalité et délai de recours**	**15 jours**
36	**Travaux**	**195 jours**
37	Période de préparation de chantier	20 jours
38	Préfabrication geobags, tapis et stock matériaux	20 jours
39	Travaux Maritimes	5 mois
40	Intempéries et réception chantier	20 jours
41	Travaux de finition	15 jours
42	Recollement et inspection	1 mois
43		
44		
45
